

Fiche bilan du micro-projet



Projet GAMA
Gestion et Animation de Mare a bwè et Anse Dumont - zones humides du Gosier



I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Ville du Gosier, Liliane MONTOUT
Coût total du projet (en euro)	44 655 €
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	20 000 € soit 45%
Lieu de réalisation	Ville du Gosier – Sites de Mare à Bwè et Anse Dumont
Contact (mail et tel)	cvaley@villedugosier.fr 0690 99 00 82 / 0590 84 96 92 0590 84 95 96 / 0590 84 96 91
Date de début du micro-projet	Septembre 2023

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

La ville du Gosier a été reconnue une seconde fois territoire engagée pour la nature pour la mise en place du plan d'actions identifié à travers le Plan de Développement Durable et l'Atlas de la Biodiversité Communale. Elle a été lauréate du micro-projet TERres MERS Ultra-Marines pour la seconde fois en 2023 pour la mise en valeur des espèces patrimoniales du territoire et en particulier de l'Anse Dumont.

Les objectifs recherchés par le projet sont les suivants :

- Assurer la continuité des projets lancés et l'engagement de la ville pour la nature (façade littorale et zones rurales)
- Améliorer la gestion de deux sites naturels par l'acquisition d'équipement adapté aux zones humides et la formation par le compagnonnage des agents de la ville dont l'agent du littoral
- Amélioration de qualité de l'accueil du public et animation des sites
- Améliorer la connaissance et la prise en compte des enjeux par les agents de la ville et du public sur les sites identifiés en vue de reproduire le modèle sur d'autres sites

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

Les évolutions de gouvernance, de pilotage et d'arbitrages budgétaires nationaux. La rénovation de l'observatoire ornithologique a été reportée.

Le projet a été redéfini autour d'un sentier ornithologique sur la Pointe Canot depuis l'Anse Dumont basé sur l'actualisation d'inventaires ornithologiques, l'installation de pupitres d'observation, la révision du panneau d'accueil et d'un carbet obsolète en espace pédagogique.

La recherche de financements complémentaires avec pour conséquence la difficulté à mobiliser certains acteurs dont l'équipe pédagogique pour mener les actions sur l'aire terrestre éducative. Toutefois d'autres actions pédagogiques ont pu être discutées avec divers partenaires (SINNOVAL, CARL, Ecole Montessori).

Tous ces aléas ont eu un impact important sur le démarrage du projet et sa finalisation.

Rappel des partenaires du micro-projet

- Conservatoire du Littoral
- Entreprises privées
- Mission Locale
- Pôle Relai Zones Humides Tropicale
- Office Français de la Biodiversité

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4
(commentaires, 300 car. max)

- Mai-Juillet 2024 : Démarrage de la création d'une page internet dédiée à la mise à disposition des données d'inventaire faune sur le littoral
- Septembre 2024 : suivi ornithologique, acquisition de matériels
- Octobre 2024 : Opérations de régulation des espèces exotiques envahissantes a également été menée en particulier la laitue d'eau (*Pistia stratiotes*) avec le concours de l'UICN et de l'OFB, Sensibilisation des agents dont les agents du littoral, Démarrage de la création des maquettes de la signalétique, entretien du site de mare à bwè
- Novembre 2024 : acquisition de matériels complémentaires (jumelles, pièges photos), Suivi des EEE, formation de l'agent du littoral, diagnostic territorial des élèves du lycée hôtelier, entretien du site de mare à bwè
- Décembre 2024 (en cours) : Travaux d'élagage au tour du carbet pédagogique, installation matériel (suivi photo, éco-compteur), entretien du site de mare à bwè
- Janvier 2025 : Finalisation des travaux, Intervention en classe au lycée
- Février 2025 : Inauguration, sortie pédagogique, inventaires en interne, entretien du site de mare à bwè
- Mars/Avril : Suivi de fréquentation des sites

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4
(commentaires, 300 car. max)

- Elimination des EEE (laitue d'eau) et colonisation par le nénuphar
- Renfort de la sensibilisation à l'entretien différencié des espaces
- Montée en compétences des agents et de l'agent du littoral (entretien, gestion, suivi scientifique, animation, suivi de projet, formation au commissionnement)
- Renfort de l'équipe acté
- Partenariats scientifiques et techniques confirmés

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)

- Conservatoire du littoral : Excellente collaboration qui se poursuit sur l'ensemble des sites en gestion, confiance mutuelle renouvelée
- Pôle Relai Zones Humides Tropicale: La ville est de nouveau partenaire sur la restauration et la gestion des mares (REMAIL) ainsi que sur les Aires Éducatives
- Office Français de la Biodiversité : Accompagnement de l'équipe locale renouvelé
- Partenaire de l'éducation et publics : Volonté de nouer des partenariats durables

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	Sensibilisation - Formation interne des agents en charge de la surveillance, de la gestion du littoral et des espaces verts - Proposition d'activités assurant la mise en valeur par l'éducation à l'Environnement (aire éducative, animations d'observation) - La réalisation de supports pédagogiques d'animation et de communication - La communication sur les actions menées Actions - Acquisition d'équipements adaptés à l'entretien (enlèvement de macro-déchets) des zones humides - Suivi et l'élimination des espèces exotiques envahissantes (papyrus notamment à Mare à Bwè) - Installation de signalétique et de panneaux didactiques au niveau de l'observatoire ornithologique installé sur le site de l'Anse Dumont après rénovation par le Conservatoire - Acquisition de matériels nécessaires à l'observation naturaliste (jumelles, appareil photo) - Acquisition d'éco-compteurs pour assurer un suivi interne	Sensibilisation - Produire un ou plusieurs supports de communication pour sensibiliser les usagers des sites et réaliser des interventions itinérantes - Réaliser des opérations de sensibilisation à travers des opérations citoyennes, - Proposer aux scolaires, accueils de loisir des sorties pédagogiques encadrées - Mettre en place un projet pédagogique autour du maintien de la continuité écologique à travers une aire éducative. Actions - Disposer du matériel permettant aux agents de la régie d'être des acteurs encore plus conscients de leur rôle en faveur d'une biodiversité sous pression. - Maîtriser la colonisation des EEE et maintenir un équilibre des espèces (faune, flore) en présence - Maintenir un cadre de vie propice à la fréquentation des lieux par des usagers encadrés ou en visite libre - Disposer d'un observatoire ornithologique rénové, intégré au paysage et adapté pour en faciliter l'entretien et éviter les actes d'incivilité sur le site de l'Anse Dumont pour lui	Sensibilisation - Interne : agents d'entretien et agent du littoral à la régulation des EEE - Externe obtention de fonds CARL pour la reprise de l'aire terrestre éducative en 2024-2025 <u>Novembre 2024</u> : Formation de l'agent du littoral à l'observation avec Zont Production en vue de programmation sortie publique Actions Organisation permettant un entretien régulier (macro déchets, EEE) des sites cibles (1/trimestre minium) <u>Mai-Juillet 2024</u> : - Démarrage de la création d'une page internet dédiée à la mise à disposition des données d'inventaire faune sur le littoral <u>Septembre 2024</u> : - Suivi ornithologique, - Acquisition de matériels d'observation et d'entretien - Acquisition de 2 éco-compteurs <u>Octobre 2024</u> : - Partenariats confirmés (OFB, CDL, UICN)	Sensibilisation • Animation Aire terrestre éducative • Animation pédagogique (ATE + Sortie grand public) Actions • Signalétique et mise en valeur media des actions menées (enclos, régulation) • Etude du trait de côté • Rénovation interne du carbet et transformation en carbet pédagogique • Diagnostic territorial par l'équipe projet du lycée hôtelier

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

	Consolidation Prise en compte des données et retours d'expérience dans les décisions politiques (révision du PLU, mesure de protection forte) et d'études (ABC Intercommunal) et d'animations du territoire	redonner ses fonctionnalités initiales. - Poursuivre la mise en place des conditions nécessaires à l'intégration du site de l'Anse Dumont en Espace Naturel Sensible Consolidation - Disposer en interne de moyens pour suivre les données d'inventaires disponibles - Mettre en place les conditions de la réalisation d'inventaires en régie sur les sites pilotes et plus largement sur les sites identifiés comme stratégiques pour les corridors écologiques, la trame verte - Meilleure connaissance des espèces exotiques envahissantes - Définir les besoins pour le lancement d'une étude pour améliorer l'accueil maîtrisé du public, - Mettre en lumière les actions à travers la presse locale	- Signalétique : création de maquette pour panneau d'accueil et pupitres d'interprétation et carbet pédagogique - Régulation EEE - Site intégré au projet REMA II - Suivi/régulation insuffisamment documentée Consolidation - Pérennisation des enclos de régénération en place - Présence régulière de l'agent du littoral et meilleure connaissance du terrain	Consolidation • Collecte de données chiffrées sur la fréquentation (après installation) • Documentation des suivis • Mise en place d'une externalisation partielle avec formation des partenaires
Partenariats (diversité des statuts)				

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

II.2 Exécution financière :

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

		PREVISIONNEL			REEL (FACTURES ACQUITTEES AU 31/12/2024)				
Détail des coûts	Intitulé de la dépense	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont financement retenu par l'OFB dans le cadre de Te Me Um	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um	dont autres financements
permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du micro-projet	1 500,00 €	1 500,00 €		2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €		
	Autre	10 260,00 €	10 260,00 €		10 260,00 €	10 260,00 €	10 260,00 €		
Personnel non permanent									
Déplacements	Déplacements (ie vols longs courriers)								
	Déplacements locaux	3 282,00 €	3 282,00 €		3 281,64 €	3 281,64 €	3 281,64 €		
	Hébergement								
	Restauration								
Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)		10 400,00 €	10 400,00 €		5 306,90 €	5 306,90 €	5 306,90 €		
Autre	Location salle et matériel								
	Honoraires prestataires techniques	7 363,00 €	7 363,00 €	4 300,00 €	6 575,00 €	6 575,00 €	2 275,00 €	4 300,00 €	
	Honoraires prestataires (location bus)	600,00 €	600,00 €						
	Edition (ex : frais d'impression)	5 650,00 €	5 650,00 €	4 520,00 €	75,20 €	75,20 €	-4 444,80 €	4 520,00 €	
	Gratification stagiaire Frais de traiteur - collations (animations, réunions) Formation	5 600,00 €	5 600,00 €		1 656,87 €	1 656,87 €			1 656,87 €
Total		44 655,00 €	44 655,00 €	8 820,00 €	29 555,61 €	29 555,61 €	19 078,74 €	8 820,00 €	1 656,87 €
							29 555,61 €		
# par rapport au prévisionnel							15 099,39 €	33,81%	

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

.....

.....

.....

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Certaines factures liées aux travaux (8 928.02€ minimum) ne seront établies que début 2025. Elles seront donc acquittées au plus tard le 1^{er} mars 2025, tel que prévu par la décision d'affectation dans son annexe convention prévoit une fin au 1er mars 2025.

D'autre part, le temps passé par les partenaires institutionnels et en particulier le Conservatoire du Littoral n'est pas valorisé dans le bilan.

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)

La pérennité dans l'emploi d'un agent du littoral depuis 2021 permet une surveillance renforcée du territoire.

Il a été formé en 2024 en vue de son commissionnement en 2025.

L'acquisition d'équipements (2 éco-compteurs, 3 pièges photos, 3 paires de jumelles, 8 waders viennent compléter les moyens de surveillance, d'entretien et d'animation des sites.

Leçons à tirer pour des futurs micro-projets (dont éléments et acquis répliquables du micro-projet - 400 car. max)

- L'importance de l'anticipation à quasi N+2 des projets de façon la plus détaillée possible pour palier au manque de ressources et d'ingénierie ainsi que les aléas.
- La maîtrise foncière des sites concernés par les projets car le temps de concertation est difficilement estimable compte tenu des cas très nombreux d'indivisions
- Une bonne préparation et un portage politique sont des facteurs essentiels de réussite
- Communication accrue notamment sur les sites lorsque l'opération est ponctuelle

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)

- Perspectives de mise en œuvre d'actions plus impactantes (mesures de protection forte, programme d'animations annuelles)
- Mise en relief des enjeux pour l'aménagement et les mesures de protection (régulation de l'accueil, prise en compte dans la révision du PLU, Classement en ENS)
- Opportunités de collaborations externes avec l'école privée fréquentant le site et la communauté d'agglomération pour la mise en œuvre d'études et d'animations
- Prise en compte des propositions de réorganisation/renfort de la Direction sur le suivi des projets, l'entretien renforcé des sites

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)

La ville du Gosier poursuit son engagement envers la nature à travers l'actualisation de données disponibles dans l'ABC notamment sur les oiseaux. Elles sont vulgarisées via un sentier d'interprétation entre l'Anse Dumont et la Pointe Canot.

Des équipements intégrés au paysage accompagneront les randonneurs à la découverte des oiseaux présents sur ces paysages riches et variés. Le parcours traverse des mangroves, de la végétation littorale, des savanes ainsi que de la forêt sèche.

Les pressions subies par les espaces littoraux du Gosier sont aussi abordées : érosion littorale, forte houle, pression urbaine, incivilités mais également jaunissement des palmacées, ...

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um


**L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.*

Lien inventaire oiseaux : [exemple du 04/09/2024](#)

Emplacement signalétique




Maquette Panneau Accueil

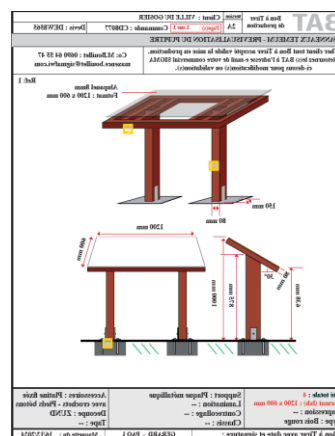

Pupitre Maquette exple contenu et BAT Support (validation en cours)

Matériels acquis

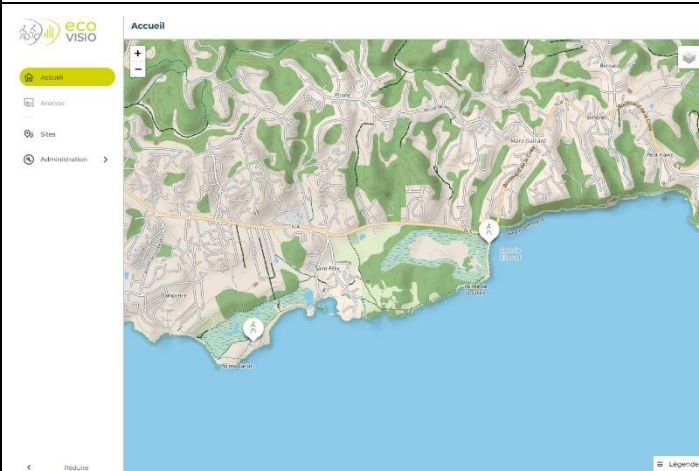

2 éco-compteur : suivi de fréquentation



éco-compteur implanté à Saint-Félix



Pièges photos



Jumelles



Mare le 09/10/2024 : Avant Intervention conjointe
régulation EEE (laiture d'eau)

23/10/2024 : Intervention conjointe
(Ville/UICN/OFB) régulation EEE (laiture d'eau)
avec utilisation des waderset stockage bache sur
place



Octobre 2024 : Invasion de laitue d'eau



Février 2025 : Colonisation de néphares
